

Leistungsprüfung nach W-405

Dienstag, 12. April 2022

Auftraggeber

Gemeinde Mömlingen
Hauptstr. 70
63853 Mömlingen

Ausführende Firma

ZV AMME
Am Wieselsweg 3
63906 Erlenbach am Main

**Verantwortlicher Prüfer:**

Peter Gall

Verwendetes Meßgerät

Hydrantenprüfgerät mit der Seriennummer
250289

Allgemeine Angaben zum Hydrant

Hersteller: VAG
Bezeichnung: Flansch
Typ: Unterflurhydrant

Abgänge: normal
Nennweite: DN-80
Hydrantennummer: Möm Hyd 192

Position des Hydranten

Standort: Am Schlaggraben
Straße und Nr. Am Schlaggraben 14
Ort: Mömlingen

GPS-Position der Messung

Breite: 49° 50' 59,54" N Länge: 9° 04' 27,83" E
Höhe: 142m

Angewandte Norm

Anlehnung an W-405

Meßwerte

Begin der Messung Montag, 11. April 2022 12:59
Ende der Messung Montag, 11. April 2022 13:01

Durchfluss

Minimaler Durchfluss 0 l/min
Maximaler Durchfluss 2702 l/min
Mittlerer Durchfluss 1781 l/min
Gesamtmenge 4066 liter

Druck

Minimaler Druck 0,726 bar
Maximaler Druck 7,558 bar
Mittlerer Druck 2,956 bar

Hydrantenleistung

Ruhedruck (Schieber geschlossen) 6,627 bar

Fließdruck (Schieber auf) 0,813 bar

Durchfluß (Schieber auf) 2685 l/min

Fließdruck (Schieber angepasst) 1,529 bar

Durchfluß (Schieber angepasst) 2647 l/min


Bemerkung

Sonstiges

Die Trübung wurde nicht bestimmt.

Die Wassertemperatur wurde nicht gemessen.

Datum / Unterschrift (ausführende Firma) _____ / _____

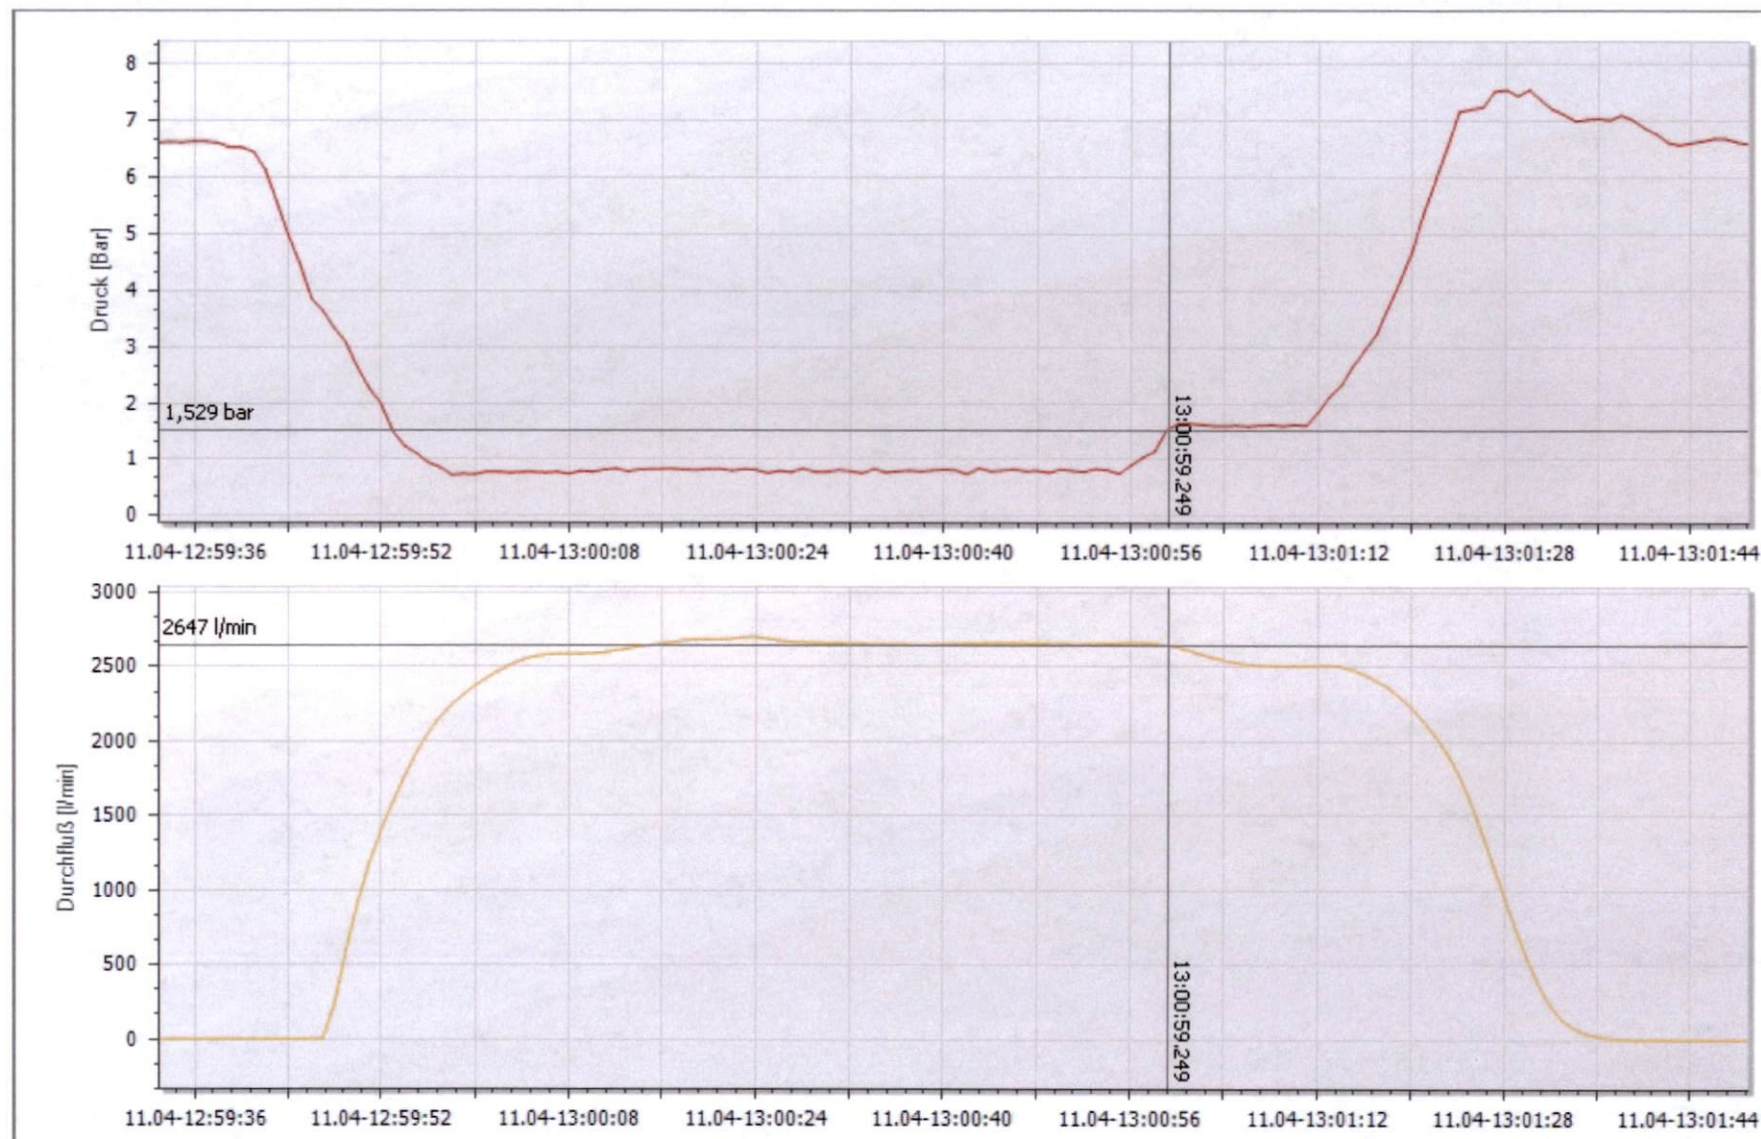

Auftraggeber

Gemeinde Mömlingen
Hauptstr. 70
63853 Mömlingen

Ausführende Firma

ZV AMME
Am Wieselsweg 3
63906 Erlenbach am Main



Verantwortlicher Prüfer:

Peter Gall

Verwendetes Meßgerät

Hydrantenprüfgerät mit der Seriennummer
250289

Allgemeine Angaben zum Hydrant

Hersteller: VAG
Bezeichnung: Flansch
Typ: Unterflurhydrant

Abgänge: normal
Nennweite: DN-80
Hydrantennummer: Möm Hyd 193

Position des Hydranten

Standort: Am Schlaggraben
Straße und Nr. Am Schlaggraben 1
Ort: Mömlingen

GPS-Position der Messung

Breite: 49° 50' 59,69" N Länge: 9° 04' 24,32" E
Höhe: 190m

Angewandte Norm

Anlehnung an W-405

Meßwerte

Begin der Messung Montag, 11. April 2022 13:27
Ende der Messung Montag, 11. April 2022 13:30

Durchfluss

Minimaler Durchfluss 0 l/min
Maximaler Durchfluss 2711 l/min
Mittlerer Durchfluss 1437 l/min
Gesamtmenge 3496 liter

Druck

Minimaler Druck 0,508 bar
Maximaler Druck 6,849 bar
Mittlerer Druck 3,016 bar

Hydrantenleistung

Ruhedruck (Schieber geschlossen) 6,353 bar

Fließdruck (Schieber auf) 0,527 bar

Durchfluß (Schieber auf) 2678 l/min

Fließdruck (Schieber angepasst) 1,506 bar

Durchfluß (Schieber angepasst) 2222 l/min


Sonstiges

Die Trübung wurde nicht bestimmt.

Die Wassertemperatur wurde nicht gemessen.

Bemerkung

Datum / Unterschrift (ausführende Firma) _____ / _____

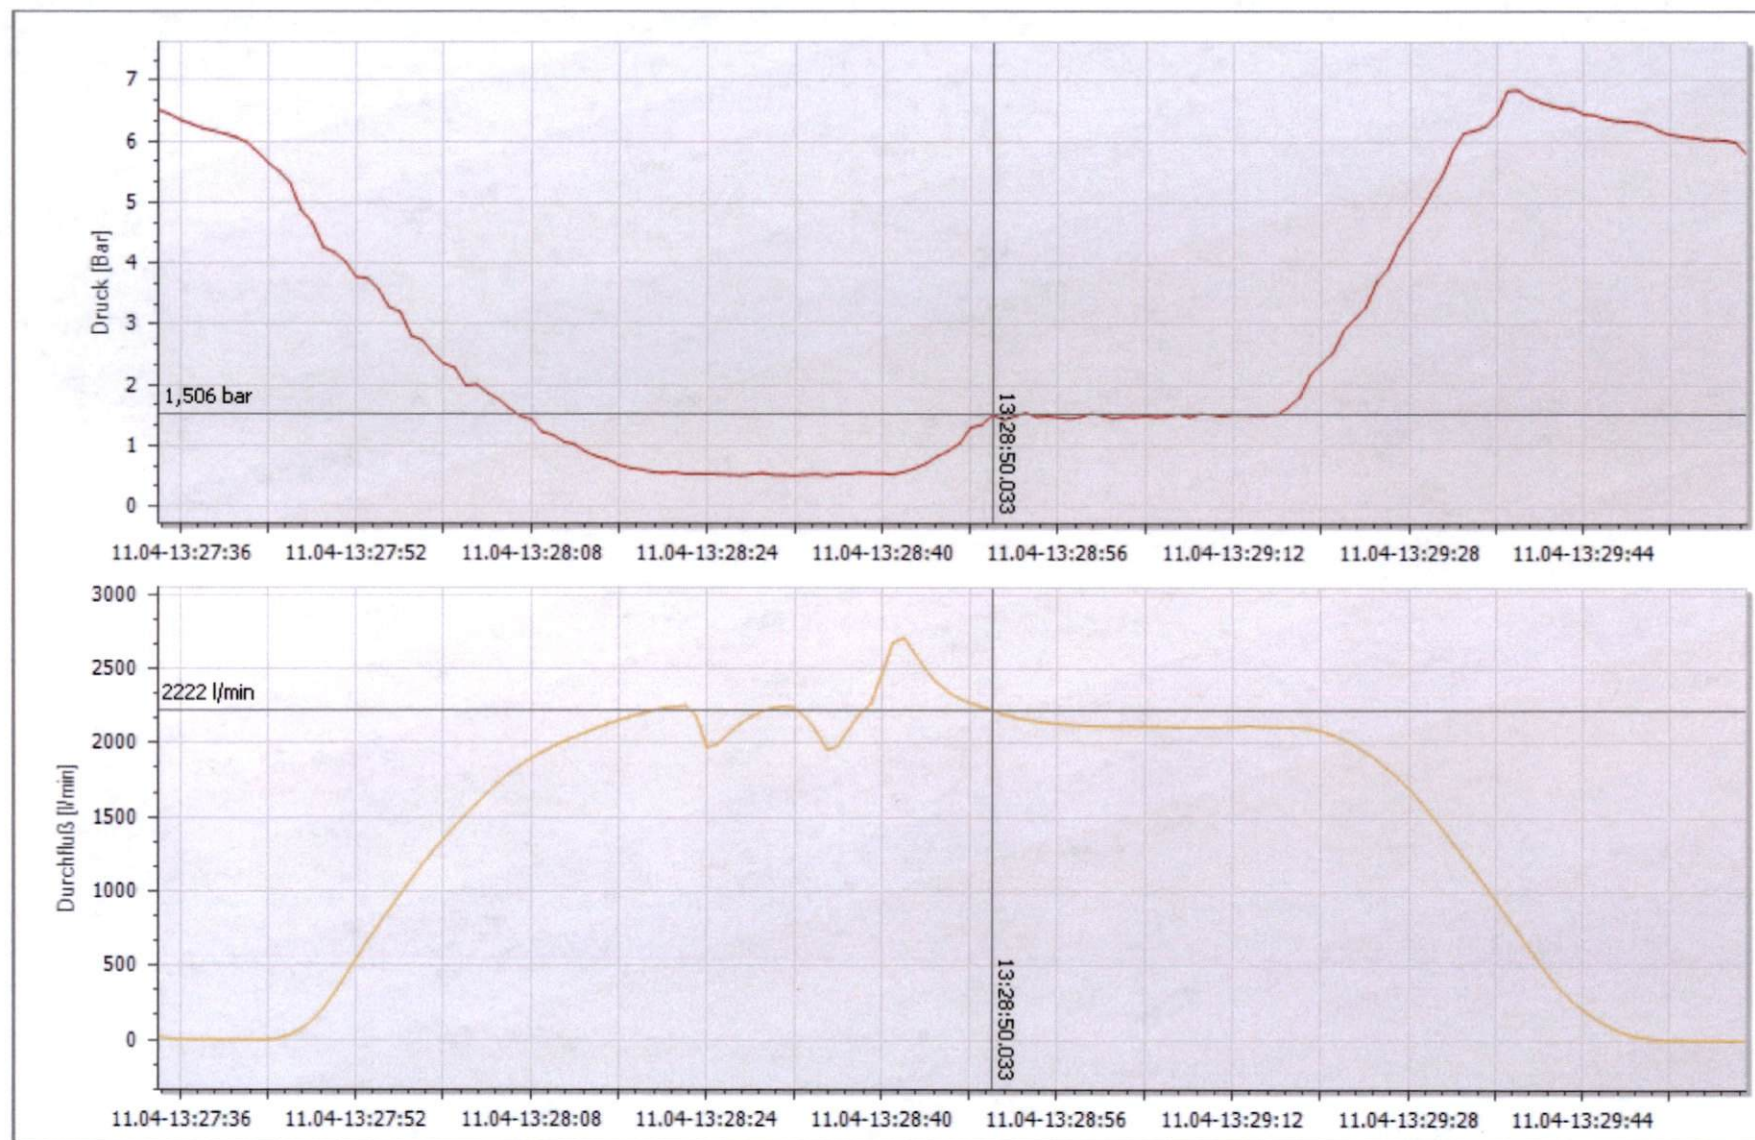

Auftraggeber

Gemeinde Mömlingen
Hauptstr. 70
63853 Mömlingen

Ausführende Firma

ZV AMME
Am Wieselsweg 3
63906 Erlenbach am Main



Verantwortlicher Prüfer:

Peter Gall

Verwendetes Meßgerät

Hydrantenprüfgerät mit der Seriennummer
250289

Allgemeine Angaben zum Hydrant

Hersteller: VAG
Bezeichnung: Flansch
Typ: Unterflurhydrant

Abgänge: normal
Nennweite: DN-80
Hydrantennummer: Möm Hyd 194

Position des Hydranten

Standort: Am Schlaggraben
Straße und Nr. Am Schlaggraben 26
Ort: Mömlingen

GPS-Position der Messung

Breite: 49° 50' 58,5" N Länge: 9° 04' 24,27" E
Höhe: 138m

Angewandte Norm

Anlehnung an W-405

Meßwerte

Begin der Messung Montag, 11. April 2022 13:36
Ende der Messung Montag, 11. April 2022 13:38

Durchfluss

Minimaler Durchfluss 0 l/min
Maximaler Durchfluss 2405 l/min
Mittlerer Durchfluss 1343 l/min
Gesamtmenge 2104 liter

Druck

Minimaler Druck 0,942 bar
Maximaler Druck 7,91 bar
Mittlerer Druck 4,018 bar

Hydrantenleistung

Ruhedruck (Schieber geschlossen) 6,96 bar

Fließdruck (Schieber auf) 1,691 bar

Durchfluß (Schieber auf) 2401 l/min

Fließdruck (Schieber angepasst) 1,545 bar

Durchfluß (Schieber angepasst) 2324 l/min


Sonstiges

Die Trübung wurde nicht bestimmt.

Die Wassertemperatur wurde nicht gemessen.

Bemerkung

Datum / Unterschrift (ausführende Firma) _____ / _____

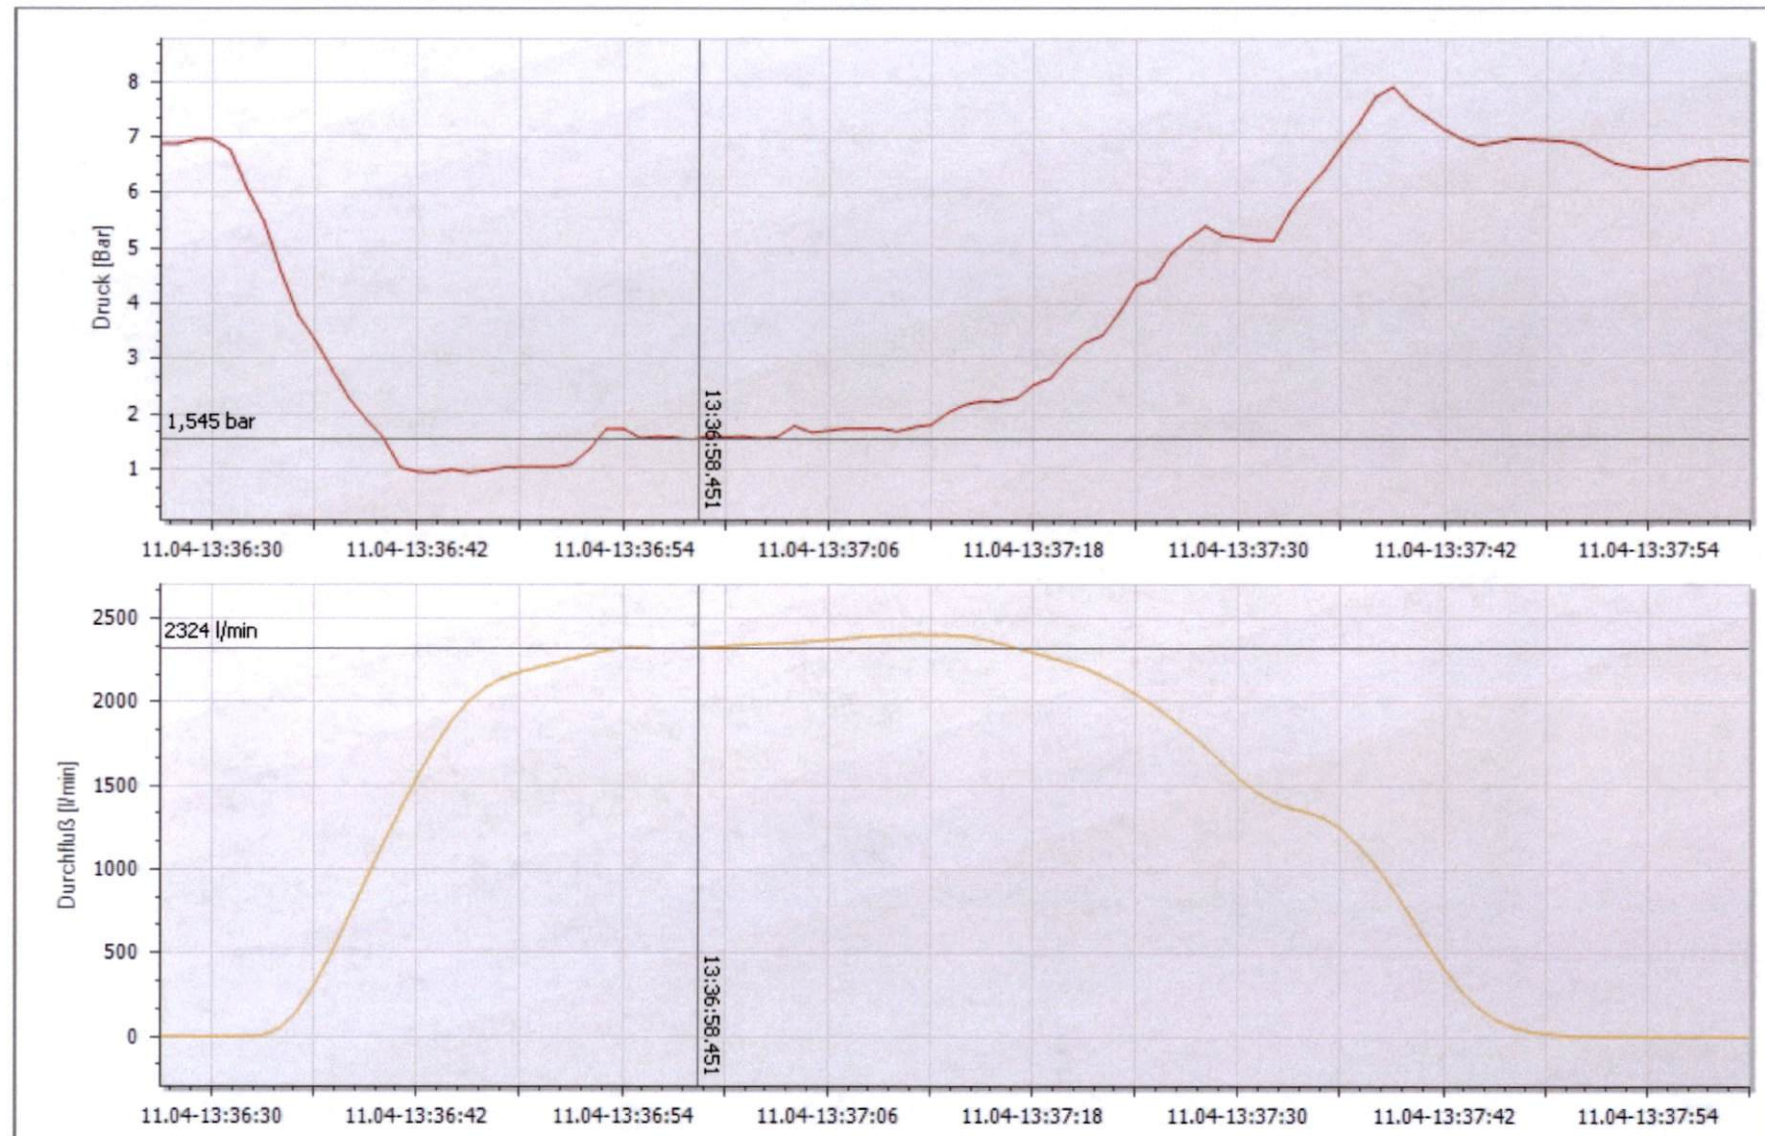

Auftraggeber

Gemeinde Mömlingen
Hauptstr. 70
63853 Mömlingen

Ausführende Firma

ZV AMME
Am Wieselsweg 3
63906 Erlenbach am Main



Verantwortlicher Prüfer:

Peter Gall

Verwendetes Meßgerät

Hydrantenprüfgerät mit der Seriennummer
250289

Allgemeine Angaben zum Hydrant

Hersteller: VAG
Bezeichnung: Flansch
Typ: Unterflurhydrant

Abgänge: normal
Nennweite: DN-80
Hydrantennummer: Möm Hyd 195

Position des Hydranten

Standort: Am Schlaggraben
Straße und Nr. Am Schlaggraben 2
Ort: Mömlingen

GPS-Position der Messung

Breite: 49° 51' 01,87" N Länge: 9° 04' 29,42" E
Höhe: 146m

Angewandte Norm

Anlehnung an W-405

Meßwerte

Begin der Messung Montag, 11. April 2022 13:18
Ende der Messung Montag, 11. April 2022 13:20

Durchfluss

Minimaler Durchfluss 0 l/min
Maximaler Durchfluss 2528 l/min
Mittlerer Durchfluss 1504 l/min
Gesamtmenge 3459 liter

Druck

Minimaler Druck 0,585 bar
Maximaler Druck 6,629 bar
Mittlerer Druck 3,086 bar

Hydrantenleistung

Ruhedruck (Schieber geschlossen) 6,178 bar

Fließdruck (Schieber auf) 0,642 bar

Durchfluß (Schieber auf) 2528 l/min

Fließdruck (Schieber angepasst) 1,516 bar

Durchfluß (Schieber angepasst) 2448 l/min


Sonstiges

Die Trübung wurde nicht bestimmt.

Die Wassertemperatur wurde nicht gemessen.

Bemerkung

Datum / Unterschrift (ausführende Firma) _____ / _____

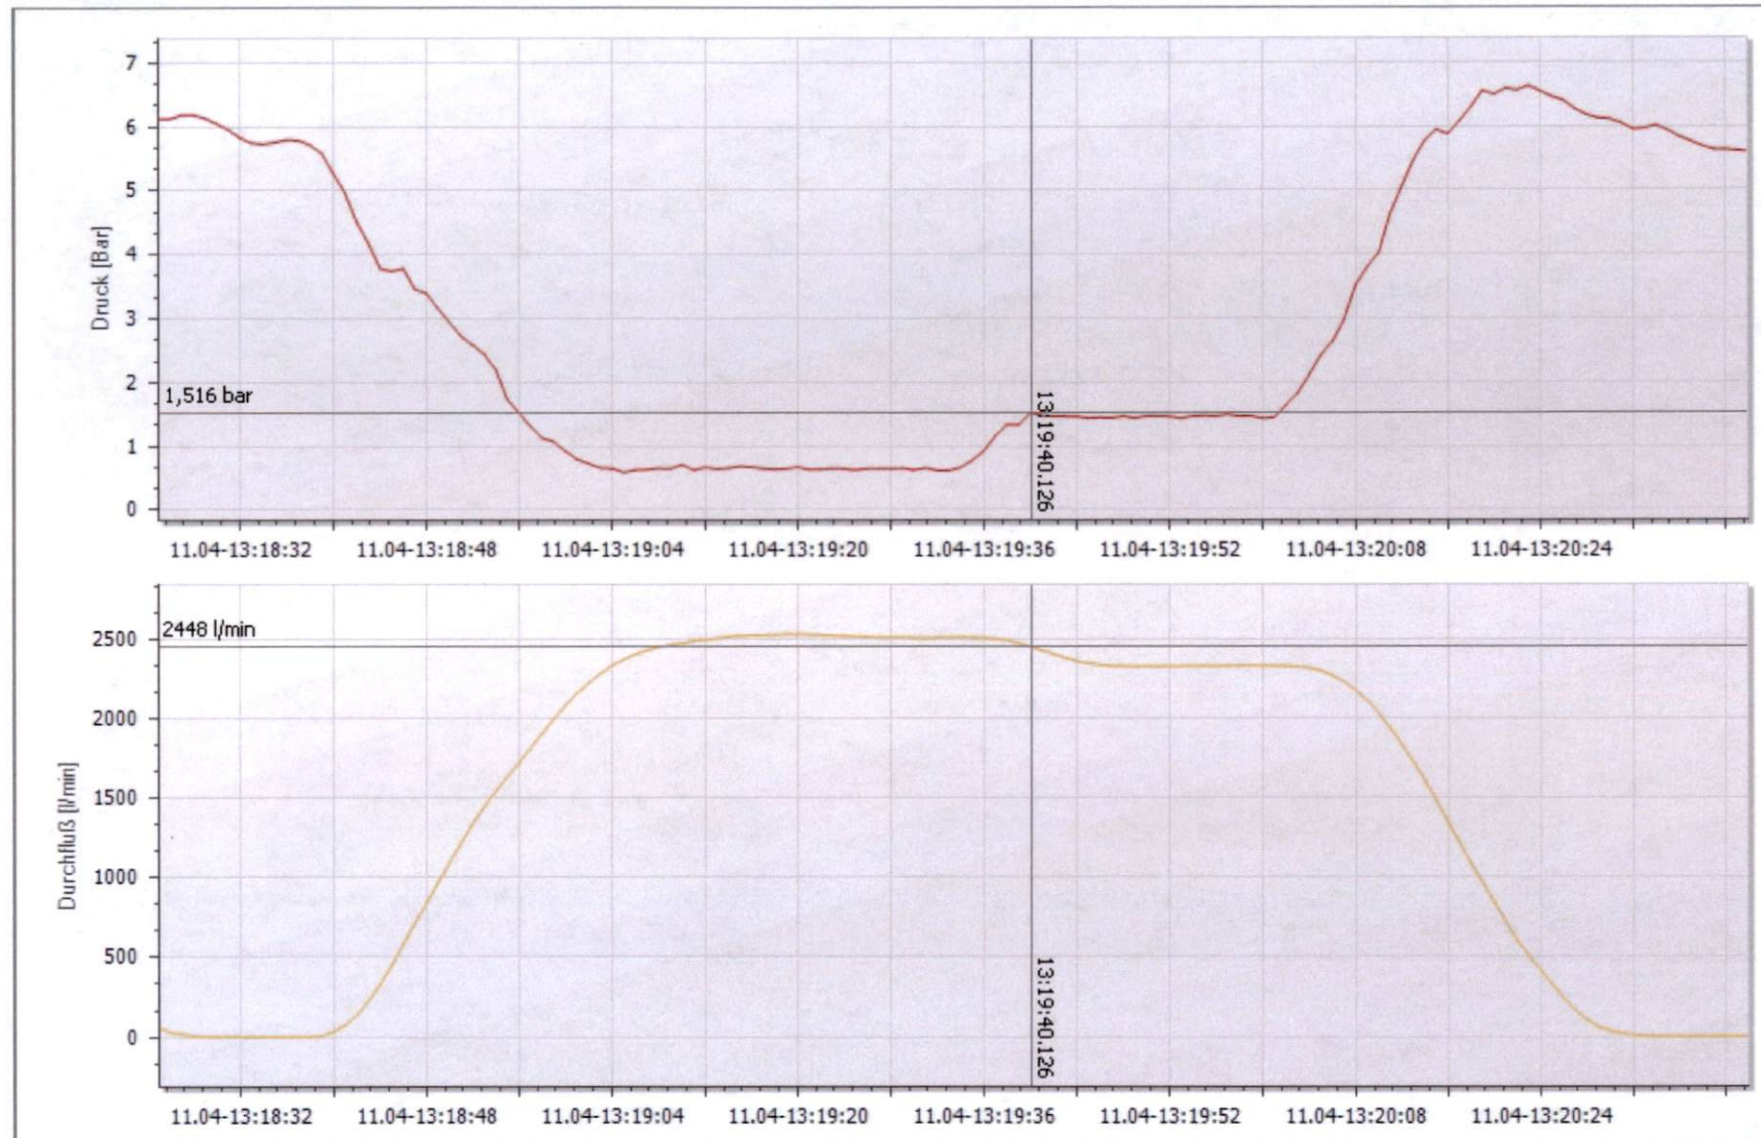

Auftraggeber

Gemeinde Mömlingen
Hauptstr. 70
63853 Mömlingen

Ausführende Firma

ZV AMME
Am Wieselsweg 3
63906 Erlenbach am Main



Verantwortlicher Prüfer:

Peter Gall

Verwendetes Meßgerät

Hydrantenprüfgerät mit der Seriennummer
250289

Allgemeine Angaben zum Hydrant

Hersteller: VAG
Bezeichnung: Flansch
Typ: Unterflurhydrant

Abgänge: normal
Nennweite: DN-80
Hydrantennummer: Möm Hyd 196

Position des Hydranten

Standort: Am Schlaggraben
Straße und Nr. Am Schlaggraben 6
Ort: Mömlingen

GPS-Position der Messung

Breite: 49° 51' 00,56" N Länge: 9° 04' 31,41" E
Höhe: 144m

Angewandte Norm

Anlehnung an W-405

Meßwerte

Begin der Messung Montag, 11. April 2022 13:08
Ende der Messung Montag, 11. April 2022 13:10

Durchfluss

Minimaler Durchfluss 0 l/min
Maximaler Durchfluss 2718 l/min
Mittlerer Durchfluss 1778 l/min
Gesamtmenge 4179 liter

Druck

Minimaler Druck 0,691 bar
Maximaler Druck 7,864 bar
Mittlerer Druck 2,935 bar

Hydrantenleistung

Ruhedruck (Schieber geschlossen) 6,817 bar

Fließdruck (Schieber auf) 0,774 bar

Durchfluß (Schieber auf) 2717 l/min

Fließdruck (Schieber angepasst) 1,526 bar

Durchfluß (Schieber angepasst) 2676 l/min

Sonstiges

Die Trübung wurde nicht bestimmt.

Die Wassertemperatur wurde nicht gemessen.

Bemerkung

Datum / Unterschrift (ausführende Firma) _____ / _____

